




คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง กระบวนการตรวจงาน ตรวจการจ้างก่อสร้าง

วันที่	12 ตุลาคม 2552
เสนอโดย	กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
สอบทานโดย	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, สำนักกฎหมาย
อนุมัติโดย	อธิบดีกรมสรรพสามิต

 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ ทางเทคนิค	คู่มือการปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-003
	เรื่อง กระบวนการตรวจงาน ตรวจการจ้างก่อสร้าง	การแก้ไขครั้งที่ :
		วันที่เริ่มใช้ : 12 ตุลาคม 2552
		หน้าที่ : 1 จาก 4

1. วัตถุประสงค์


เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาและตรงตามแผนที่วางไว้ และการตรวจงานก่อสร้างนั้นจะทำให้เราทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน ความคืบหน้าของงาน แล้วทำให้เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาใช้แก้ไขปรับปรุงได้ต่อไปในอนาคต

2. ขอบเขต

- 2.1 ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างกับคณะกรรมการตรวจการจ้างของแต่ละจังหวัด
- 2.2 ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบ และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธา และตามที่ได้ออกแบบ
- 2.3 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำบันทึกการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3. คำจำกัดความ

- 3.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการออกแบบ ปฏิบัติงานตรวจสอบรูปแบบ และรายการประกอบแบบตัวอาคาร
- 3.2 วิศวกร หมายถึง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
- 3.3 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า บุคคลหรือบริษัทผู้ควบคุมงานที่กรมสรรพสามิตแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างแทนกรมสรรพสามิต
- 3.4 คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายความว่า คณะกรรมการที่กรมสรรพสามิตแต่งตั้งขึ้นในคราวเดียวหรือเป็นครั้งคราวให้เป็นผู้แทนควบคุมดูแล ในขณะระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแทนกรมสรรพสามิต
- 3.5 ผู้รับจ้าง หมายความว่า ผู้ประกวดราคาที่ได้ทำสัญญาจ้างเหมากับกรมสรรพสามิต
- 3.6 รูปแบบ หมายความว่า แบบแปลนที่รวมอยู่ในเอกสารประกอบสัญญา และให้หมายความรวมถึงแบบแปลนที่ออกเพิ่มโดยกรมสรรพสามิต
- 3.7 รายละเอียดประกอบแบบ หมายความว่า ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ ทางเทคนิค	คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจงาน ตรวจ การจ้างก่อสร้าง	หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-003
		การแก้ไขครั้งที่ :
		วันที่เริ่มใช้ : 12 ตุลาคม 2552
		หน้าที่ : 2 จาก 4

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 วิศวกรเชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป สังกัดกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

4.2 วิศวกรชำนาญการพิเศษ หมายถึง วิศวกรชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐาน การออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการส่ง เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง สิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ

4.3 วิศวกรโยธาชำนาญการ หมายถึง วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหน้าที่เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง สิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ

4.4 นายช่างโยธาชำนาญงาน หมายถึง มีหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้าง สิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ

4.5 ช่างโยธาชำนาญงาน หมายถึง มีหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการ จ้าง สิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกร ชำนาญการพิเศษ วิศวกรเชี่ยวชาญ มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้าง ยื่นหนังสือแจ้งขอส่งงวดงานการก่อสร้าง


5.2 วิศวกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

5.3 วิศวกรชำนาญการพิเศษ พิจารณาสั่งการ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งตามแต่ละจังหวัดดำเนินการ


5.4 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการเดินทางไปตรวจสอบความถูกต้อง ณ สถานที่ก่อสร้างตามแต่ละจังหวัด


5.5 ผู้ควบคุมงาน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า ปัญหาการ ดำเนินการ แล้วเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง

5.6 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการทำบันทึกการตรวจรับงาน

 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ ทางเทคนิค	คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจงาน ตรวจ การจ้างก่อสร้าง	หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-003
		การแก้ไขครั้งที่ :
		วันที่เริ่มใช้ : 12 ตุลาคม 2552
		หน้าที่ : 3 จาก 4

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการตรวจงาน ตรวจการจ้างก่อสร้าง

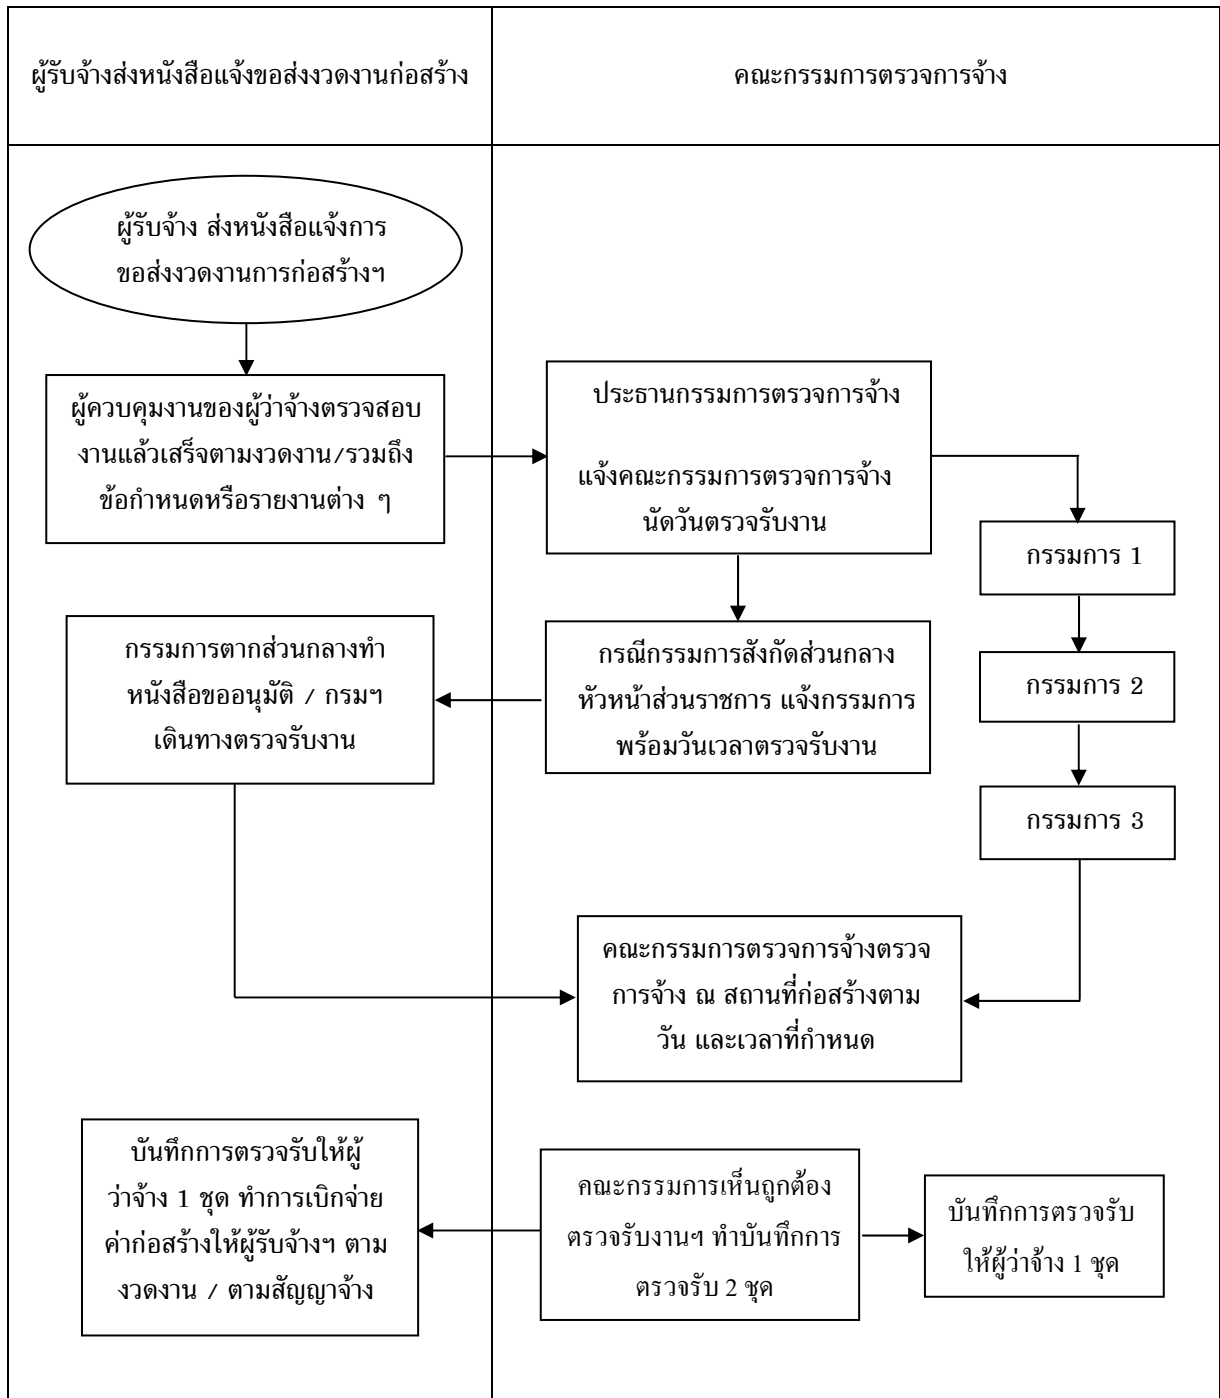

 <p>กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ ทางเทคนิค</p>	<p>คู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง กระบวนการตรวจงาน ตรวจ การจ้างก่อสร้าง</p>	หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-003
		การแก้ไขครั้งที่ :
		วันที่เริ่มใช้ : 12 ตุลาคม 2552
		หน้าที่ : 4 จาก 4

6. เอกสารอ้างอิง

-

7. แบบฟอร์มที่ใช้

-

8. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้จัดเก็บ	สถานที่	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
1. การแต่งตั้ง คณะกรรมการและ สัญญาการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่	ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค	ตลอดไป	-
2. บันทึกการตรวจ รับงานแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่	ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค	ตลอดไป	-
